

## 108 學年度第二次承攬作業協議組織會議紀錄

壹、時 間：109 年 3 月 2 日（星期一）15：00~16：20

貳、地 點：野聲樓 1 樓谷欣廳

參、主持人：環安衛中心劉席瑋組長

記 錄：環安衛中心張銘惠技士

肆、出席人員：陳慧玲總務長、環安衛中心李慧玲主任、營繕組陳柏亨組長、事務組田建菁組長(黃麗香代)、環安衛中心王嘉雯護理師、仁園福利餐廳梁玉珍女士、心園餐廳王清鵬先生、雲瀚企業社(輔園餐廳)蔡植卓先生、文園餐廳(百富)詹凱琴女士、理園餐廳(義美吉盛)林奕齊先生、輔原社會企業有限公司張擢奇先生、全日美清潔有限公司王維民先生、忠華保全事業股份有限公司陳嘉生先生、勁環環保工程有限公司林純如女士、全聯實業股份有限公司新莊輔大分公司黃捷暘先生、前瞻機電工程有限公司王文彬先生、允承科技工程有限公司陳盈志先生、永富工程行鐘明道先生、老松工程有限公司黃筠薰女士、利眾營造工程股份有限公司黃筠薰女士、錦欣工程有限公司郭明仁先生、開創工程科技有限公司蔡海石先生、俊議實業有限公司蔡宛璇女士、翔弘空調工程有限公司黃靖瑋先生、仲德工程有限公司曾守德先生、天峰工程有限公司許時縣先生、兆信工程有限公司(未出席)、東橋室內裝修有限公司李明原先生、大岳室內設計有限公司紀慧如女士、宜豐鋼鋁工程行賴美丹女士、仲順鋼鋁有限公司許綜顯先生、北興機電有限公司李瑞祥先生、台灣開利股份有限公司(未出席)、仕鑫工程行許仕憲先生、大陸水工股份有限公司謝庭霸先生、欣全工程有限公司(未出席)、羿展環境工程有限公司(未出席)、日高工程實業股份有限公司陳獻平先生、擎邦國際科技工程股份有限公司謝豐聲先生張家齊先生、甲頂營造有限公司(未出席)、三木工程股份有限公司陳詒承先生、名田營造工程有限公司(未出席)、富陽營造工程有限公司左文宏先生、齊祥工程股份有限公司巫紹民先生、新晁室內裝修工程有限公司(未出席)、中映電梯實業有限公司蔡佩薰女士、太友實業股份有限公司陳志賢先生、崇友實業股份有限公司陳榮昌先生、台灣三菱電梯股份有限公司王壽鴻先生、台灣康恩電梯技術服務股份有限公司(未出席)、懿誠電梯有限公司潘啓迪先生、永大機電工業股份有限公司(未出席)

伍、參與安全衛生教育訓練之總務處機動、電工、木工人員：吳正三、李彥彬、范軒洋、戴昱恒、吳正宗、李秉豐、黃明枝、高輝雄、鄭劍超、林正昇、田嘉文、林清水

陸、主席致詞：略。

柒、確認上次會議紀錄及待辦事項執行狀況：

一、協議組織會議記錄可自行至環安衛中心網頁

(<http://www.ehs.fju.edu.tw/generalServices.jsp?labelID=44>)安全衛生->承攬協議組織查看。

二、請所有工程依規定執行「施工前中後檢查表」，並繳交至環安衛中心。

三、校內大型建物工程皆有營建廠商自己的勞安人員，請依規定每月召開協議組織會議，影本送環安衛中心備查。

●日高：請依規定自行召開會議，並繳交影本備查。

●擎邦：請依規定自行召開會議，並繳交影本備查。

四、再次提醒所有施工人員於吊車搭乘設備作業皆須確實勾好安全帶、戴好安全帽，校內總務處工友部分，請總務處協助帶回宣導。

五、部份廠商尚未繳交「承攬商加入協議組織申請表」及其他需續交申請表者，懇請營繕組、事務組協助通知繳交。

●仍未交：台灣康恩電梯技術服務股份有限公司、永大機電工業股份有限公司、日高工程實業股份有限公司(到108.8.26)、忠華保全事業股份有限公司(到107.9.30)、開創工程科技有限公司(到108.8.31)、東橋室內裝修有限公司(到106.3.10)、北興機電有限公司(到108.7.31)、台灣開利股份有限公司(到108.7.31)、中映電梯實業有限公司(到108.7.31)、太友實業股份有限公司(到107.7.31)、台灣三菱電梯股份有限公司(到106.7.31)、懿誠電梯有限公司(到108.8.31)。

捌、會議討論與決議事項：

一、承攬作業位置



二、承攬商與承攬項目：

承攬項目	公司名稱
餐廳、超市	仁園福利餐廳、心園餐廳、雲瀚企業社(輔園餐廳)、文園餐廳(百富)、理園餐廳(義美吉盛)、輔原社會企業有限公司、全聯實業股份有限公司新莊輔大分公司
清潔外包	全日美清潔有限公司
保全	忠華保全事業股份有限公司
廢棄物清運	勁環環保工程有限公司
室內裝修	東橋室內裝修有限公司、大岳室內設計有限公司、新晁室內裝修工程有限公司
機電、消防	前瞻機電工程有限公司
機電	允承科技工程有限公司
水電	永富工程行、兆信工程有限公司
水電、土木	老松工程有限公司
土木、防水	開創工程科技有限公司、錦欣工程有限公司
防水	天峰工程有限公司
鋼鋁	宜豐鋼鋁工程行、仲順鋼鋁有限公司
電力	北興機電有限公司
空調	俊議實業有限公司、台灣開利股份有限公司、仕鑫工程行、翔弘空調工程有限公司、仲德工程有限公司
營造	日高工程實業股份有限公司、擎邦國際科技工程股份有限公司、甲頂營造有限公司、利眾營造工程股份有限公司、三木工程股份有限公司、名田營造工程有限公司、富陽營造工程有限公司
土木	齊祥工程股份有限公司
汙水	大陸水工股份有限公司
電梯維護	中映電梯實業有限公司、太友實業股份有限公司、崇友實業股份有限公司、台灣三菱電梯股份有限公司、台灣康恩電梯技術服務股份有限公司、懿誠電梯有限公司、永大機電工業股份有限公司

三、危害告知會議資料統計(108.9.18~109.2.24)

工程名稱	廠商名稱	承攬	危告知日期
輔大理工實驗大樓新建工程	擎邦國際科技工程股份有限公司	108.6.17~110.6.29	108.7.8
汙水處理設施代操作委託	大陸水工股份有限公司	107.9.1~109.8.31	107.9.21
防鳥網更換工程	鴻揚安全網工程行	108.9.25(已完工)	108.9.25

全校病媒防治工程	京錡環境衛生有限公司	108.10.5~108.10.31 (已完工)	108.10.2
文華樓屋頂修繕	仲順鋼鋁有限公司	108.11.4~108.11.5 (已完工)	108.10.15
全校抽水肥	悠境實業有限公司	108.11.4~108.11.8 (已完工)	108.10.15
外語學院低壓幹線改善工程(配合理工新大樓基地管路遷移)	正誼工程顧問有限公司	108.10.25~108.11.25 (已完工)	108.10.24
公博樓側大王椰子修剪作業	竣誠企業有限公司	108.11.8(已完工)	108.11.5 11
外語學院德芳大樓窗貼施工	三學實業有限公司	108.11.15~109.1.6 (已完工)	108.11.12
2019 校園聖誕燈佈置	老松工程有限公司	108.11.15~109.1.31 (已完工)	108.11.15
文開樓防鳥網修繕	易昌網漁具有限公司	108.11.22~108.11.24 (已完工)	108.11.22
藝文美術館廣告帆布施工	佳音廣告企業有限公司	108.12.1(已完工)	108.11.28
修整建棒球場地工程	昱峰工程有限公司	108.11.25~108.12.15 (延後)	<b>108.11.29</b>
于樞機墓園周遭走道透水鋪面工程	齊祥工程股份有限公司	108.12.5~109.2.25 (已完工)	108.12.4
文友樓耐震能力補強暨電梯增建結構工程	三木工程股份有限公司	108.12.8~109.5.1	108.12.5
體育系積健樓 3 樓跑步機設備吊掛	大裕儀器有限公司	108.12.17(已完工)	108.12.16 12
自來水大水塔外牆水泥剝落修繕	錦欣工程有限公司	108.12.21(已完工)	108.12.17
吊掛運動賽事視覺帆布廣告	昊悍創意整合行銷有限公司	109.1.7(已完工)	109.1.7
輔仁大學倬章樓進修部文開樓 5 台電梯汰換更新工程	崇友實業股份有限公司	109.1.11~109.2.29 (已完工)	109.1.9
織品系 TC308.408.409 教室空間改善工程	富陽營造工程有限公司	109.1.13~109.3.8	109.1.10
織品系典藏室空調整修工程	黃白室內裝修設計工程有限公司	109.1.14~109.3.14 (已完工)	109.1.14

大水塔自來水井水塔蓄水設備清洗	老松工程有限公司	109.1.18~109.1.19 (已完工)	109.1.16
理一舍外牆磁磚修繕	兆信工程有限公司	109.1.23~109.2.9 (已完工)	109.1.21
理一舍自來水分支水源幹管裝接工程	老松工程有限公司	109.1.22(已完工)	109.1.21
理二舍變電站冷氣電源配置	永富工程行	109.2.3~109.2.29 (已完工)	109.2.3
聖言樓倬章樓外牆清洗	肯林恩清潔股份有限公司	109.2.5~109.2.6	109.2.5
信義和平宿舍熱泵汰換工程	鴻茂工業股份有限公司	109.2.5~109.2.29 (已完工)	109.2.6
宜聖宿舍環境消毒	東泰順實業有限公司	109.2.10~109.3.2 (已完工)	109.2.10
羅耀拉樹德樓伯達樓外牆清洗	清匠工程企業有限公司	109.2.19~109.2.21 (已完工)	109.2.12
聖言樓 SF446 冷氣汰換	翔弘空調工程有限公司	109.2.15~109.2.19 (已完工)	109.2.13
聖言樓 9 樓外牆防水工程	錦欣工程有限公司	109.2.21~109.2.22 (已完工)	109.2.19
濟時樓戶外排水管堵塞汰換更新	阜川實業有限公司	109.2.20~109.2.21 (已完工)	109.2.20
織品系圓編針織機裝機	典洋針織機械股份有限公司	109.2.25~109.2.27 (已完工)	109.2.20 14
積健樓 4 樓冷氣更換	上永富科技有限公司	109.2.24(已完工)	109.2.24
資工系 SF642SF650 辦公室窗型冷氣汰換	翔弘空調工程有限公司	109.3.5~109.3.6	109.2.24

#### 四、校內外稽查單位發現安全衛生缺失檢討。

##### (一)校內巡檢發現缺失-施工

##### 1. 防鳥網更換工程(鴻揚安全)

(1)非工作人員穿越吊裝物下方危險區範圍。

##### 2. 2019 校園聖誕燈佈置(老松工程)

(1)吊掛作業未指派人員負責指揮監督工作。

##### 3. 文開樓防鳥網修繕(易昌網漁)

(1)未繳交施工人員勞保資料。(重複缺失共罰款 500 元)。

4. 于樞機墓園周遭走道透水鋪面工程危害告知單(齊祥工程)
  - (1) 施工人員未戴安全帽。
5. 宜聖宿舍新建工程(日高工程、協進工程)
  - (1) 施工人員未戴安全帽。(重複缺失共罰款 500 元)
  - (2) 使用不合格合梯走路。(重複缺失共罰款 500 元)
  - (3) 有電箱無中隔板。

## 五、安全衛生注意事項宣導。

### (一) 工程

1. 須完成危害告知始可進行工程施作。(違者自行負責!!)
2. 承商對於所僱用工作人員，應投保勞保及相關保險，且應實施必要之安全衛生教育訓練及災害預防訓練，須留紀錄並繳交影本給環安衛中心備查。
3. 施工人員一定要穿戴合格防護具(安全帽、安全索、安全鞋等)。
4. 施工區出入口應標示告示牌標註工程名稱、工程期間、緊急連絡人等資訊，危險區域應設置警告標示及安全圍籬。
5. 作業前，應實施作業前安全裝備檢查及機具檢點。
6. 禁止使用 2 公尺以上之合梯，且合梯梯腳間繫材確實扣牢，不可使用木梯，人員不得利用合梯行走，合梯下方需有止滑墊、合梯作業最高二階踏階禁止踩踏與作業且一定要夥同作業。
7. 高處作業，應確認護欄、護蓋、安全網設置妥當，或使用安全帶等墜落防止設施；施工開口處須有防止墜落措施跟明顯警告標語。
8. 施工鋼瓶需確實直立固定，確認有效期限，並備有安全資料表。
9. 施工開挖地面須先與相關單位確認網路線、電線等管線位置，若無法得知則須於事前就作業地點及其附近，施以鑽探、試挖或其他適當方法從事調查，擬訂開挖計畫，以避免挖斷管線、感電、建物損壞或有毒氣體洩漏之情況發生，影響校方權益。
10. 局限空間作業，需先執行機械通風，並實施氧氣及有毒體測定，達安全標準才可入內，作業中需每 2 小時測定氧氣與可燃性氣體濃度；須備有個人防護器具(呼吸式防護具)、防護索及及救援設施，且有適當人員在外監護。
11. 施工人員禁止於施工現場吸菸、飲酒。
12. 如發生職安法 37 條職業災害之一：(1)發生死亡災害、(2)發生災害之罹災人數在三人以上、(3)發生災害之罹災人數在一人以上，且

需住院治療，除立即將傷者送醫外，不可破壞現場，需立刻通報本校發包單位與環安衛中心，並於八小時內通報勞動檢查機構。

13. 事故處理完畢請填寫輔仁大學校園工程承攬事故調查報告表繳回環安衛中心

<http://www.ehs.fju.edu.tw/resource.jsp?labelID=22>

#### (二) 垃圾清運

1. 垃圾清運廠商須為政府認定核可之廢棄物清除公司。
2. 車輛於行駛中，禁止人員攀附於車廂或車頂外。
3. 請按工作性質配戴口罩、手套、反光帽、反光背心，著安全鞋等安全配備。
4. 夜間或雨天作業，須加設警告燈號。
5. 出勤前應向工作人員做工作提醒及危害說明。
6. 請勿將垃圾清運至非法廢棄物處理場域。

#### (三) 餐廳

1. 確認有水作業區設備皆有漏電斷路器等防止感電裝置。
2. 瓦斯需固定並在有效期限內，需設有洩漏警報裝置，放置區須有嚴禁煙火標示，備有安全資料表。
3. 冷凍庫門之外推裝置需經常檢查確保功能正常。
4. 消防設備與逃生出口前禁止堆放雜物。
5. 廢油與廚餘需確認交由合格廠商處理。
6. 定期清潔油煙處理設備，避免油煙異味影響師生。
7. 烹飪用水都須為自來水禁止使用地下水，並依規定委託合格廠商檢測飲用水與食用冰塊須符合主管機關公告之標準。

#### (四) 清潔人員、保全

1. 如需使用 A 字梯，請使用合格有繫材之鋁梯，且須戴安全帽。
2. 若需開電器開關箱請戴防感電(絕緣)手套。
3. 夜間巡視時，盡量穿著顏色鮮明背心，避免被車輛碰撞。
4. 勿擅自操作故障設備，如：升降機外門開啟。
5. 勿接近危險場所，如：施工區、屋頂開口處等。
6. 清潔人員於打蠟、除草等作業時，請穿戴所需之防護具如口罩、護目鏡等。
7. 使用之機械，如有傳動帶、傳動輪、齒輪、轉軸等被捲、夾、擦傷之虞者，應設護罩，禁止因方便而拆除。
8. 清潔人員整理垃圾時，請注意有無危險物品，如燈管、針筒、化學

藥品等，避免受傷。

9. 留意工作區之氣溫，避免中暑。

(1) 對所屬員工應辦理勤前教育及預防熱危害之安全衛生教育訓練：

(i) 實施個人自主健康管理、(ii) 補充水分、(iii) 選擇適當穿著以透氣、吸汗為佳，如：棉質、易排汗材質等；以淺色為佳，以減少輻射熱量吸收。

(2) 如戶外工作環境氣溫達攝氏三十六度時，應進行以下防護措施：


(i) 適時運用遮陽設備、風扇、細水霧或其他技術以降低工作環境氣溫。(ii) 隨時注意員工體溫或任何不舒服之反應，並安排適當休息時間。

(五) 電梯維修

1. 昇降設備維修廠商須為取得營建主管機關立案合格者，並指派取得昇降設備技術士資格之人員從事設置、安裝、檢修及實施定期維護保養，禁止指派無執照人員，且保養紀錄須確實填寫。
2. 升降機外門專用鑰匙須統一由專業廠商保管使用，不得逕行提供給保全或清潔等人員開啟升降機外門，以避免墜落電梯機坑危害。
3. 升降機維修作業如需強制開啟升降機外門時，應配掛安全帶等防止墜落預防措施，並規劃於最低樓層實施。
4. 電梯進行維修保養作業時，請清楚標示或放置明顯告示，除管理人員外，任何人不得取下標示牌，以免發生傷亡。

六、校內工作人員安全衛生注意事項及危害告知

(一) 禁止使用「不合格無安全繫材之合梯。」

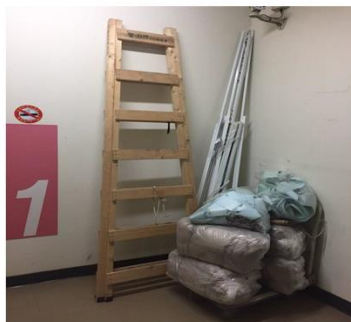

**職業安全衛生法第6條第1項**

雇主對下列事項應有符合規定之必要安全衛生設備及措施：

...

五、防止有墜落、物體飛落或崩塌等之虞之作業場所引起之危害。

十三、防止通道、地板或階梯等引起之危害。

**職業安全衛生法第43條**

處新臺幣三萬元以上三十萬元以下罰鍰



**職業安全衛生設施規則第230條**

雇主對於使用之合梯，應符合下列規定：

一、具有堅固之構造。

二、其材質不得有顯著之損傷、腐蝕等。

三、梯腳與地面之角度應在七十五度以內，且兩梯腳間有金屬等硬質繫材扣牢，腳部有防滑絕緣腳座套。

四、有安全之防滑梯面。

雇主不得使勞工以合梯當作二工作面之上下設備使用，並應禁止勞工站立於頂板作業。





(二)本校實驗室內有害/感染/非感染/固體 有害事業廢棄物不得丟棄於生活垃圾桶。



- 如發現一般垃圾桶中有實驗室廢棄物，請拍照通知環安衛中心(分機3021)
- 如可辨識為哪間實驗室所有，則直接退回給實驗室自行處理。

(三)校內飲水機都有安裝漏電斷路器，若有異常請通報環安衛中心。

不只平靜水面，可能「一秒變殺手」；落地式飲水機，還有路燈、電線桿擠進「觸電設施」前三名。水電專家范清福說：「電線破損或老化的話，這個們雖然是蓋起來，可是有接觸到這個外殼的話，你人去搭到這個鐵柱就滿容易觸電。」




若在清潔飲水機有疑似被電到覺得麻麻的不要覺得沒關係，一定要立刻通報，並拔除插頭、張貼提醒公告

(四)校內工友使用吊車鋸樹應有吊掛人員合格證，周圍須設圍籬，且人員須戴安全帽及扣安全索。



**職業安全衛生法第6條第1項**  
 雇主對下列事項應有符合規定之必要安全衛生設備及措施：  
 ...  
 五、防止有墜落、物體飛落或崩塌等之虞之作業場所引起之危害。

**職業安全衛生法第43條**  
 處新臺幣三萬元以上三十萬元以下罰鍰



(五)吊車需依規定執行機械之定期檢查。

**職業安全衛生管理辦法第20條**  
 雇主對移動式起重機，應每年就該機械之整體定期實施檢查一次。  
 雇主對前項移動式起重機，應每月依下列規定定期實施檢查一次：  
 一、過捲預防裝置、警報裝置、制動器、離合器及其他安全裝置有無異常。  
 二、鋼索及吊鏈有無損傷。  
 三、吊鉤、抓斗等吊具有無損傷。  
 四、配線、集電裝置、配電盤、開關及控制裝置有無異常。

精仁大學總務處移動式起重機檢索設備作業檢查點表

單位：總務處事務組 機械編號： 檢查日期： 年 月 日

序	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
檢 查 項 目																															
1. 過捲預防裝置或警報裝置正常。																															
2. 鋼索及吊鏈在整機運行時無異常。																															
3. 吊鉤及抓斗等吊具有無損傷。																															
4. 控制裝置(如操作桿、開關等)運作正常。																															
5. 制動器正常運作正常，無異常、鎖死及油壓不足。																															
6. 吊機結構之車體、連接處及配線等，均無構成嚴重結構安全之隱憂。																															
7. 檢查機械人員前，應先以機體最大作業高度，進行空載測試，確認過捲預防裝置運作正常，應先以最大作業高度，保持至少5分鐘以上，確認其可靠性及安全性無異常。																															
8. 檢查完作業人員後，應將機械之總檢查表，送交於該機械之負責人。																															
檢 查 人 員 簽 名																															
備 註																															

作業前執行

檢 查 人 員： 單位 主管： 一級單位 主管：




**職業安全衛生法第45條**  
 處新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰

(六)執行木工作業時，使用指定機械設備須通過型式檢定，請配戴耳塞、口罩等防護具，避免聽力受損及呼吸。

**應型式檢定之機械設備器具**


中央主管機關指定之機械、設備或器具公告列入商品檢驗品目者

1. 動力衝剪機械
2. 手推刨床
3. 木材加工用圓盤鋸
4. 動力堆高機
5. 研磨機
6. 研磨輪
7. 防爆型電氣設備




**職業安全衛生法第6條第1項**  
 雇主對下列事項應有符合規定之必要安全衛生設備及措施：  
 一、防止機械、設備或器具等引起之危害。  
 ...

**職業安全衛生法第40、41條** 處一年至三年以下有期徒刑  
**職業安全衛生法第43條** 處新臺幣三萬元以上三十萬元以下罰鍰




**反撥預防裝置 標準60-1**

圓盤鋸應設置圓盤鋸之反撥預防裝置。但橫鋸用圓盤鋸或因反撥不致引起危害者，不在此限。



**鋸齒接觸預防裝置 標準60-2**

圓盤鋸應設置圓盤鋸之鋸齒接觸預防裝置。但製材用圓盤鋸及設有自動輸送裝置者，不在此限。



(七)沒有防護罩切割木板，材料反彈，手差點不見。(宣導影片)

七、安全衛生及環保事項之實施及配合。

(一)工程相關申請表單請至環安衛中心網頁下載(表單下載>職業安全衛生>承攬作業)

1. 承攬作業危害因素告知單(一式兩份)
2. 承攬商加入協議組織申請表(一份)
3. 危險作業(吊掛、局限、動火、高架)管理流程(列印所須表單，吊掛跟局限作業一日填寫一張，且須附上相關佐證文件，如：一機三證、局限空間作業主管、屋頂作業主管)
4. 施工人員勞保資料
5. 施工人員安全衛生教育訓練證明

(二)請保持工區整潔，降低危害風險。

(三)工程如有危險作業要填寫以下申請單：

1. 高架(空)作業
2. 局限空間作業(每日)
3. 動火作業
4. 吊掛作業(每日)

●吊掛作業未提出申請，警衛不會放行吊車進入校區。

(四)若廠商向本校總務處借用吊車，也須填寫吊掛作業申請。(申請時與他案一樣要提供吊車與操作人員合格證)

(五)工程人員需每日填寫「施工前中後檢查表」並給發包承辦人員或單位監督人員簽名。

輔仁大學施工前中後檢查表 (一機三證，本表每日填寫一張)	
<p><b>一、施工資料</b></p> <p>1. 工程名稱: _____ ; 2. 施工區域: _____</p> <p>3. 承攬商名稱: _____ ; 4. 填寫日期: 年 月 日</p> <p>5. 承攬商現場負責人: _____ ; 6. 承攬商現場負責人電話: _____</p> <p>7. 本工種 <input type="checkbox"/> 吊掛 <input type="checkbox"/> 限空 <input type="checkbox"/> 動火 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 其他空開等危險作業</p>	
<p><b>二、施工前防護措施檢查</b></p> <p><input type="checkbox"/> 施工前準備: <input type="checkbox"/> 本局機電: <input type="checkbox"/> 工作/動機整修區域設置適當不影響通車安全;</p> <p><input type="checkbox"/> 安全: <input type="checkbox"/> 各危險作業已依其作業許可證內容進行檢查</p> <p>其他: _____</p>	<p>施工場所管理委員會監督人員檢核簽名:</p>
<p><b>三、施工中檢查</b></p> <p>違反施工規範事項: <input type="checkbox"/> 無: <input type="checkbox"/> 有: _____</p> <p>處理結果: <input type="checkbox"/> 已改善, 說明: _____</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 停工</p>	<p>施工場所管理委員會監督人員檢核簽名:</p>
<p><b>四、施工中變更諮詢溝通紀錄</b></p> <p><input type="checkbox"/> 無變更: <input type="checkbox"/> 有變更: _____</p> <p>注意事項: _____</p> <p>承辦人員: _____</p>	<p>承攬商現場監督人: _____</p>
<p><b>五、施工後檢查</b></p> <p><input type="checkbox"/> 動火作業完成後 30 分鐘, 確認已無危險之虞; <input type="checkbox"/> 臨時用電設施已關閉或拆除;</p> <p><input type="checkbox"/> 臨時隔離措施、設備、管制標誌均已拆除; <input type="checkbox"/> 工作區域清理乾淨;</p> <p>其他: _____</p> <p style="text-align: right;">承攬商離場時間: _____ 時 分</p>	<p>施工場所管理委員會監督人員檢核簽名:</p>
<p>流程: 施工場所管理委員會監督人員填寫 → 施工前中後檢查 → 環安衛中心存查</p>	

施工前中後檢查表請承攬人每日填寫，並給原管理責任單位監督人員檢查後簽名，完成後擲回環安衛中心存查。

## 七、協調事項。

(一)從事以下危險作業之管制:動火、高架、開挖、爆破、局限空間、有害物質、高壓電活線等。

1. 動火作業：向環安衛中心提出申請完成危害告知會議始可施作，並

執行危險作業管制。

●擎邦國際-輔大理工實驗大樓新建工程(大型工程請記得自行進行作業管制，並填寫申請單告知動火作業期程)。

●108/9/18~109/2/24 有通報執行廠商：擎邦國際、崇友實業

2. 高架作業：向環安衛中心提出申請完成危害告知會議始可施作，並執行危險作業管制。

●擎邦國際-輔大理工實驗大樓新建工程(大型工程請記得自行進行作業管制，並填寫申請單告知高架作業期程)。

●108/9/18~109/2/24 有通報執行廠商：三木工程、三學實業、肯林恩清潔

3. 高壓電維修作業：向環安衛中心提出申請完成危害告知會議始可施作。

●北興機電:尚未完成危害告知

4. 開挖作業：向環安衛中心提出申請完成危害告知會議始可施作，並確認開挖區之管線分布狀況，小心開挖避免挖斷電線、水線、瓦斯管線與網路線等。

●水管、電線、網路線修繕、遷移等工程。

●擎邦國際-輔大理工實驗大樓新建工程(大型工程請記得自行進行作業管制)。

●108/9/18~109/2/24 有通報執行廠商：擎邦國際、齊祥工程、三木工程、老松工程、永富工程、阜川實業

5. 局限空間作業：向環安衛中心提出申請完成危害告知會議始可施作，須備有缺氧作業主管，並執行危險作業管制。

●水塔清洗、汙水場維護。

●108/9/18~109/2/24 有通報執行廠商：大陸水工、老松工程。

(二)電氣機具及作業人員進場管制。

1. 108/9/18~109/2/24 有通報執行電氣作業廠商：

●日高工程、大陸水工、擎邦國際(鴻祥工程)、正誼工程、老松工程、昱峰工程、齊祥工程、三木工程、錦欣工程、崇友實業、富陽營造、黃白室裝、永富工程、肯林恩清潔、鴻茂工業、清匠工程、翔弘空調、阜川實業、典洋針織、俊議實業、宜豐鋼鋁、優森環保、佳音廣告、欣全工程、快通衛生。

2. 請遵守以下用電注意事項：

●電器接線應按本校電工指定開關箱接用，始得用電，嚴禁使用絕緣

損壞之電器用品。

- 所有使用之電器需有漏電斷路器或作業前有漏電檢測。
- 電氣作業應在斷電情況下作業，並將該電路開關上鎖或標示「禁止送電」、「停電作業中」或設置監視人員監視之。
- 工作場所、人員身體衣物及其他可能接觸電氣之物品嚴禁潮濕。
- 對電路之檢查、修理等活線作業時，應使該作業勞工戴用絕緣用防護具，或應使用活線作業用器具或其他類似之器具。

(三)變更管理事項：108/9/18~109/2/24 織品系典藏室空調裝修工程，提出需變更管理事項：拆除原空調吊掛處吸音棉及夾板、為因應以後展示區維修方便，修正冷氣冷媒管配置位置。

(四)危險性機械之操作信號、工作場所標識(示)、有害物空容器放置、警報、緊急避難方法及訓練等事項。

1. 吊掛作業：向環安衛中心提出申請完成危害告知會議始可施作，須有合格一機三證，並執行危險作業管制。

- 108/9/18~109/2/24 有通報執行廠商：宜豐鋼鋁、鴻揚安全網、大陸水工、擎邦國際(鴻祥工程)、仲順鋼鋁、竣誠企業、老松工程、佳音廣告、大裕儀器、錦欣工程、崇友實業、黃白室裝、兆信工程、三木工程、肯林恩清潔、鴻茂工業、清匠工程、上永富科技、典洋針織
- 日高工程及擎邦國際因車輛進出非由正門進出，請廠商勞安人員須自行確認吊掛作業之危險性機械設備之一機三證合格性，並安排人員監督指揮，需提早申請並繳交大型車輛進出時間表。

2. 請遵守以下相關注意事項：

- 危險性機械操作範圍一定要有人指揮監督，避免人員進入下方危險區。
- 操作移動式起重機從事吊掛業之勞工，需接受訓練持有合格證。
- 如需吊升勞工，需備有有效期限內之移動式起重機搭乘設備簽認報告，且須確實使勞工穿戴安全繩索，避免人員墜落。
- 施工區出入口請標示施工名稱、日期、緊急連絡人等訊息。
- 施工產生之有害物與空容器等請於施工結束後帶離學校依規定處置。
- 本校於國璽樓1樓設有輔大診所，且學校後門設有輔大醫院，如有受傷事故，可前往就醫。

(五)協調使用打樁機、拔樁機、電動機械、電動器具、軌道裝置、乙炔熔

接裝置、電弧熔接裝置、換氣裝置及沉箱、架設通道、施工架、工作架台等機械、設備或構造物時，使用上之安全措施。

1. 請遵守以下相關注意事項：

- 108 年度起需全面使用符合國家標準-CNS4750 鋼管型施工架。(勞動部公告資訊)
- 施工架工作台應鋪滿密接之板料使無墜落之虞，並確實牢靠固定，其強度規格，需符合國家安全標準。外側應設置交叉拉桿及下拉桿等防止墜落設備。
- 施工架上方禁止堆疊物料。
- 乙炔鋼瓶須備有防回火裝置。

(六)其他承攬工程需協調之工作事項。

1. 下次承攬作業協議組織會議訂在 109 年 8 月 31 日下午 2 點，請先空下會議時間。
2. 請所有工程依規定執行「施工前中後檢查表」，並繳交至環安衛中心。
3. 校內大型建物工程皆有營建廠商自己的勞安人員，請依規定每月召開協議組織會議，影本送環安衛中心備查。
  - 日高工程實業股份有限公司、擎邦國際科技工程股份有限公司
4. 再次提醒所有施工人員於吊車搭乘設備作業皆須確實勾好安全帶、戴好安全帽，高架作業也都須做好防墜措施，避免墜落事故。
5. 新冠狀病毒肺炎防疫期間，請出入本校承攬工作人員遵守以下事項：
  - 須配戴口罩才可進入校內辦公區(含總務處、環安衛中心)。
  - 請自主執行體溫監測每日填寫表單，並於每週五繳交至環安衛中心，如超過額溫 37.5℃、耳溫 38℃，禁止進入本校工作，並盡速就醫。若六日也會作業，則改每週一繳交前一週表單即可。
  - 若工作人員曾到校工作，後確診為新冠狀病毒肺炎患者，請立刻通報環安衛中心。
  - 請主動告知工程人員旅遊史，如有主管機關判定為居家隔離、居家檢疫者請勿進入本校工作。如為自主健康管理者，須主動告知，且在校工作須全程配戴口罩。

**輔仁大學承攬商/外包體溫測量記錄表 (每週五交回環安衛中心)**

工程承攬名稱: \_\_\_\_\_  
 承攬日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日  
 工程中的時間: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 至 \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日  
 聯絡人: \_\_\_\_\_ 聯絡手機: \_\_\_\_\_ 填報日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

系統作業於 2019 年 12 月 1 日開始實施 COVID-19 (武漢肺炎) 防疫設施, 請注意所有作業人員, 每日應測量 3 次體溫, 禁止進入非工作區, 並應注意個人衛生, 佩戴口罩, 保持社交距離, 如有發燒或咳嗽等症狀, 應立即向環安衛中心(COVID-19)報告, 本表須每日填寫, 如有任何問題, 請洽環安衛中心。

記錄於下列表內:

姓名	時間	一	二	三	四	五	六	日
體溫								
症狀								
體溫								
症狀								
體溫								
症狀								
體溫								
症狀								

註 1: 症狀類別: 咳嗽、流鼻涕、鼻塞等, 請詳細填寫。  
 註 2: 人數統計請詳列於背面。

輔仁大學承攬商/外包商執照文檔

三聯/承攬名稱: \_\_\_\_\_  
 承攬日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日  
 三聯/承攬時間: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 至 \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日  
 負責人: \_\_\_\_\_ 聯絡手機: \_\_\_\_\_ 填報日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

1. 是否有公司內員工 1、2 月份有中、港、澳、韓、其他國家旅遊?  
 是, 請詳細說明(包含旅遊地點、時間)。  
 超過 14 天, 請注意防疫相關措施(勤洗手、戴口罩等)。  
 未超過 14 天, 居家隔離、檢疫者期間禁止外出工作, 自主健康管理者請全數登記。  
 否。

2. 除了在本表工作外是否在其他場所工作?  
 是, 請詳述其他工作場所。  
 否。

3. 是否有公司內員工近期繼續有中、港、澳、韓、其他國家旅遊 14 天內返國者?  
 是, 請詳細說明(包含旅遊地點、返國工作職口等)。  
 否。

4. 是否有公司內員工參加人數眾多的聚會場所?  
 是, 請詳細說明(如宗教聚會)。  
 否。



5. 職護每週會到餐廳抽查體溫。
6. 提醒總務處校內吊車執行吊掛須由有吊掛合格證照人員操作, 且作業前須確實檢查並填寫檢點表格。
7. 請總務處電工及木工檢視所使用之機械設備是否為應型式檢定者, 若為 104 年後購買者需有 TS 安全標章, 若為 104 年前購買須設置有相關防護設施, 如反撥預防裝置、鋸齒接觸預防裝置, 若有不合格者須禁止使用, 並請通報環安衛中心協助。
8. 部份廠商尚未繳交「承攬商加入協議組織申請表」, 懇請營繕組、事務組協助通知繳交。

	承攬項目	公司名稱
未交	機電	允承科技工程有限公司
	裝修土木	大岳室內設計有限公司
	營造	名田營造工程有限公司
	裝修	新晁室內裝修工程有限公司
	電梯維護	台灣康恩電梯技術服務股份有限公司
	電梯維護	永大機電工業股份有限公司
延長工期未續交	營造	日高工程實業股份有限公司(到 108.8.26)
	營造	甲頂營造有限公司(到 108.12.19)
例行駐校廠商未續交資料	餐廳	文園餐廳(百富)(到 109.1.31)
	垃圾清運	勁璟環保工程有限公司(到 108.10.31)
	保全	忠華保全事業股份有限公司(到 107.9.30)
	土木防水	開創工程科技有限公司(到 108.8.31)
	電力	北興機電有限公司(到 108.7.31)



	空調	俊議實業有限公司(到 108.12.31)
	空調	台灣開利股份有限公司(到 108.7.31)
	裝修土木	東橋室內裝修有限公司(到 106.3.10)
	電梯維護	中映電梯實業有限公司(到 108.7.31)
	電梯維護	太友實業股份有限公司(到 107.7.31)
	電梯維護	台灣三菱電梯股份有限公司(到 106.7.31)
	電梯維護	懿誠電梯有限公司(到 108.8.31)

八、相關工安事故新聞(資料來源：網路新聞)。

**登高30米施工 3人搭吊車摔死 爬梯的逃死劫**



南投市高崗工業區一間環保公司，在廠房鋼架工地（遠處）發生三死工安意外。（記者劉漢傑攝）

2019-10-10 21:16:01

【記者劉漢傑／南投報導】南投市高崗工業區一間環保公司廠房，今天下午由外包鋼構公司進行防水工程，4名工人中有3人搭吊車吊升至30公尺高的鋼架，另各工人則因吊籠傾斜3人，自行爬梯而上，惟吊籠因操作不慎，撞擊鋼架翻覆，3名工人摔落地面慘死，爬梯的工人因幸運逃過死劫，機警已到場探險，將相驗釐清事故原因。

鋼構包商今有4名員工，以及吊車司機到環保公司廠房做鋼架防水工程，由於鋼架高達27至30公尺，工人應坐吊籠上鋼架，惟吊籠僅能乘坐3人，當吊籠由楊、李、許等3名工人搭吊籠，但在吊籠上升過程中，疑似操作不當，吊籠不穩撞擊鋼構，造成吊籠翻覆，3名工人不意墜落身亡。

另各工人則因吊籠傾重，便自行爬梯上鋼架，最後卻因此逃過死劫，意外發生時，現場則有工人聽到「砰」的巨大聲響，才知發生工安意外，獲警報警。

無安全措施墜落  
受傷、死亡

北市工人7樓拆窗失足 摔落命危



台北市  
**LTN新聞快訊** BREAKING NEWS

2019-09-27 17:20:34

【記者鄭景謙／台北報導】台北市內湖路二段一處公寓今天下午3點多發生一起工安意外，51歲男性工人拆除窗戶時，不慎由7樓墜至1樓，醫送經到現場時，發現男子已經失去脈搏心跳，緊急將他送醫，目前男子仍在三總進行急救。

1. 於高處施工須採取防止墜落之必要安全措施如安全帶、索，且母索配置良好，人員不得單獨作業
2. 施工區開口處須有防止墜落措施，如：90公分高護欄。
3. 以搭乘設備乘載或吊升勞工，需防止其翻轉脫落，使勞工佩戴安全帶或安全索。

### 新營1工人拆屋頂掉落受傷 警消出動5人吊掛救援



新營消防分隊出動5人和器材車，用吊掛方式將工人救下樓送醫救治。(記者楊金城翻攝)

2019-10-06 11:19:22

【記者楊金城／台南報導】新營剛發生一起工人在拆除屋頂石棉瓦時墜落的意外，新營消防分隊出動5人和器材車，用吊掛方式救下樓送醫救治。

年約45歲的工人拆除石棉瓦屋頂不慎墜落，從4樓高掉到3樓屋頂，救援時毫無清楚。

發生意外地點在新營中山路一處民宅3樓頂，工人在拆屋頂鐵皮屋的石棉瓦時墜落到3樓頂。

台南市消防局接獲報案後，新營分隊出動小隊長曾文男、隊員黃廷翔、蔡佳明和救護員吳亞逸，陳世欽趕抵現場，檢查傷勢後固定在擔架上再以器材車的吊臂從樓頂吊掛到路邊，將人送醫。



工人在拆屋頂鐵皮屋的石棉瓦時墜落到3樓頂。(記者楊金城翻攝)



工人送醫。(記者楊金城翻攝)

無安全措施墜落  
受傷

1. 屋頂或施工架組拆，應採用符合國家標準 CNS 14253-1 同等以上規定之全身背負式安全帶及捲揚式防墜器。
2. 2公尺以上高架作業需使用施工架、不可使用合梯，如因現場作業限制也須確實固定並設防墜措施。

### 疑施工不慎 工人從32樓摔落17樓鷹架亡



高雄市新鎮區一處工地下午3時發生工人施工從32樓墜落到17樓身亡。(記者方志賢翻攝)

2019-10-20 16:35:31

首次上稿 16:16

更新時間 16:35

【記者方志賢／高雄報導】今天下午3時許，高雄市前鎮區中華、復興路口的一處新建工地，一名59歲打石工人吳姓男子疑以施工不慎，從32樓摔落到17樓鷹架上，當場身亡。

據了解，當時在32樓施工有2名工人，除了吳姓打石工人外，還有另名監工，但因2人站的地點距離很遠，吳男不慎墜落時，監工並沒有看見，後來未見吳男身影時，才趕緊找人，卻發現吳男已墜落在17樓鷹架上，趕緊報警。

吳男從32樓摔落到17樓鷹架上，警方及消防隊員僅趕往現場，吳男已無生命跡象，詳細事發原因還有待釐清。

無安全措施墜落  
死亡

1. 於高處施工須採取防止墜落之必要安全措施如安全帶、索，且母索配置良好，人員不得單獨作業
2. 施工區開口處須有防止墜落措施，如：90公分高護欄、加蓋。

## 無安全措施墜落 死亡

### 3層樓吊車突斷落 羅東T霸清洗工人不治



吊車吊機不明原因斷落，從3層樓高摔落的張姓清洗工人送醫不治。(記者提供)

2019-12-28 16:10:21  
首次上稿 12:12  
更新時間 16:10

【記者林敬倫／宜蘭報導】宜蘭縣羅東鎮公正路，一家便利商店停車場，今天凌晨1點多，一名54歲張姓工人，在清洗T霸招牌時，吊車的吊臂不明原因突然斷落，讓張姓工人從將近3樓高的架高樓落地，送醫後不治，相關調查原因，警方進一步釐清中。

張姓工人是新北市板橋人，為便利商店外部清洗窗戶與招牌的包工工人，今晚他，他與同事等吊車，到羅東公正路一間便利商店清洗招牌與窗戶，張姓工人負責自己用遙控器操控吊車，清洗較高的招牌，他的同事則負責在下方清洗較低窗戶。

不料，工作做到一半，吊車不明原因發生的斷，吊車由車頭後端或鬆裂，吊臂瞬間「啪」的一聲，衝地，導致人員的吊桶也因為動力擴大破裂，張姓工人從約3層樓的高度重重摔落，身受重傷，同事見狀急忙救護，送醫後仍不治。

事發後，警方將於今天下午驗屍，釐清張姓工人真正的死因；熱心僑工透視，由於張姓工人為新北人，後續將由新北市消防局工務處派員調查人員，接手家屬聯繫服務，釐清發生原因，則交由勞動部職業安全衛生署北區職業安全中心調查中。

### 搭建烤漆板墜17米落地 工人頭變形命危



台中一名林姓工人，今天下午搭設烤漆板屋頂，不慎摔落地面命危，現場地面還留有血跡。(記者黃連志翻攝)

2020-01-13 17:20:39

【記者陳建志／台中報導】台中35歲林姓男子今天在太平德明路一處工地搭設倉庫屋頂的烤漆板，卻不慎從高約17公尺的棚架上摔落地面，頭部重創變形，身體也多處骨折，當場沒有呼吸心跳，消防人員送往國軍台中總醫院急救中，詳細意外發生經過，警方已帶回劉姓營造商和現場工人到警局製作筆錄釐清中。

這起工安意外發生在下午3點左右，劉姓營造商承包太平德明路67巷一處鐵皮倉庫工程，今天下午在進行屋頂烤漆板覆蓋工作時，林姓工人(35歲)不慎從高約17公尺的棚架摔落地面，當場頭部變形，身體多處骨折，消防人員到場時趕緊送醫急救。

1. 每日作業前，應實施作業前安全裝備檢查及機具檢點。
2. 於高處施工須採取防止墜落之必要安全措施如安全帶、索，且母索配置良好，人員不得單獨作業
3. 吊車具合格證、需有3年內合格荷重試驗記錄、捆綁索檢點。

## 重機具操作不慎 翻覆致人員死亡

### 林口驚傳工安意外！工人遭挖土機甩噴 被機具鑽架重夾慘死

2019/12/23 11:51:00



快訊／內湖傳工安意外 工人21樓墜17樓頭部外傷命危  
被自己存放車機噴了，26歲小資族外匯投資慘案！  
酒後起爭執！男遭刺傷腹部，深可見骨 負債數萬民宅仍慘死  
台中挖取車機機車！騎士遭衝行10公尺，起警救護自視光

記者林敬倫／新北報導

今天上午8時許，位於新北市林口區吉祥路附近，一處建築工地發生意外事故，一名年約50歲的林姓男工人，疑似因操作機械不慎，導致挖土機鑽架翻覆，林男與機具相撞，夾在機具與機具之間，造成重傷，送醫後不治。

現場其他員工見狀，急的上前幫忙協助搬運，並打急救電話報警到場協助，但林男已失去生命跡象，醫護護報到場後，緊急將他送往林口長庚醫院救治，但仍無生命跡象，經送醫救治後，仍宣告不治，警方進一步釐清，並依規定移送偵辦。

### 台東大武壠怪手翻覆 1男遭壓死



2019-12-24 20:32:00

【記者陳賢義／台東報導】台東縣大武壠小後方工地傳怪手壓死人意外，一名男子疑操作不慎，怪手翻覆，不及逃生當場被壓在地，消防救護報趕往，男子明顯死亡，現正設法拖出，釐清原因調查釐清。

台東縣消防局今晚7點10分許獲報，大武壠大馬國小後方發生意外，報案人稱「有患者被怪手壓住」，指揮中心立即派遭連仁01、11、71馳援，抵達回報現場為怪手翻覆，1名男性被怪手壓住，已明顯死亡。

1. 露天開挖作業之垂直深度在1.5公尺以上，且有崩塌之虞，應設置擋土支撐。
2. 傾斜地面上之開挖作業時，若勞工有墜落之虞時，應使勞工佩帶安全帶。
3. 施工人員應注意施工週遭環境安全，以防傷及自己或別人。

## 清洗水塔未先斷電，致人員觸電死亡

### 工人清洗水塔被電死 工廠老闆未斷電被起訴

2019-12-16 13:18 聯合報 / 記者白蘭蘭 / 台中報導



工程行楊姓老闆的水塔需清洗，由陳男至工廠清洗水塔，而楊未關閉開關的連結電源，也未在電線連接點裝設護罩，陳男在清洗水塔時觸電死亡，台中地院今天依過失致死罪將楊男判6月，得易科罰金。圖/本報資料照

工程行楊姓老闆的水塔需清洗，前年由吳姓友人介紹陳男至工廠清洗水塔，楊疏未注意未關閉開關的連結電源，也未在電線連接點裝設護罩，陳男在清洗水塔時，因右胸不慎接觸安裝於水塔上方的液位控制器開關連接電線的連接點裸露部分，致陳男右側胸因感電致電灼傷而休克死亡，台中地院今天依過失致死罪將楊男判刑6月，得易科罰金。可上訴二審。

合議庭審酌，楊男坦承犯行，並表示願意賠償被害人家屬新台幣185萬元，且提出銀行支票，惟因與被害人家屬請求的240萬元仍有落差，而未能達成調解，予以判刑。

判決書指出，楊男（64歲）經營工程行，他位在中市東區東福路工廠的鐵皮建物水塔需人清洗，於2017年8月間，請託吳姓友人（證據不足，判無罪）尋找工人，經吳詢問熟識的陳姓男子，並居中為2人談妥清洗價格後，陳男即於同年8月29日上午前往楊的工廠清洗水塔。

楊男本應注意所安裝水塔液位控制器電源開關連接電線的連接點業已鏽蝕，應有防護罩避免感電，及應關閉水塔上方裝設之液位控制器電源開關，以避免清洗水塔人員遭感電危險，卻疏未注意及此，致未關閉前揭開關連結電源，亦無在電線連接點裝設防護罩。

致陳男清洗工廠上方最右側水塔時，因右胸不慎接觸安裝於水塔上方之液位控制器開關連接電線連接點裸露部分，而使他右側胸因感電致電灼傷而心因性休克死亡。後來因楊男不見陳男下來用餐，遂聯繫吳男，經吳多次撥打陳電話均無接聽，趕至工廠查看，發現陳倒臥該處，經通知中市政府消防局前來救護送醫後，仍不治死亡。

1. 電氣作業應在斷電情況下作業，並將該電路開關上鎖或標示「禁止送電」、「停電作業中」或設置監視人員監視之。
2. 所有使用之電器需有漏電斷路器或作業前有漏電檢測。

## 九、宣導影片

- (一)合梯作業安全(職安署)
- (二)鷹架施工安全宣導(勞動部)

## 十、防疫期間如何因應

- (一)新冠病毒介紹
- (二)承攬商、外包廠商的健康管理流程
- (三)正確洗手方式宣導
- (四)正確配戴口罩方式宣導
- (五)環境消毒請增加消毒頻率建議每日2次
- (六)漂白水稀釋方法宣導
- (七)增強免疫力，多運動、多吃蔬果

捌、臨時動議：無。

玖、散會：下午4點20分。
